


> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Cobinatie Van Oord Nederland / KWS Infra
Postbus 8019
4330EA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118-621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon



Datum 30 maart 2009
Onderwerp ZLD-6107, einde onderhoudstermijn

Ons kenmerk
pzdt-b-09116ultv

Uw kenmerk
ZLD-6107/HtH/209-06

Bijlage(n)

1

Geachte heer ,

Op 1 april verloopt de onderhoudstermijn van contract ZLD-6107. Naar aanleiding van uw verzoek tot aanvaarding van het werk per 1 april 2009 het volgende.

Onlangs is door onze medewerkers en collega's van het district Zeeuwse Delta (beheerder van het dijktraject) een opname gedaan. Tijdens deze opname zijn een aantal gebreken / restpunten geconstateerd. Het betreffen restpunten welke reeds eerder aan u zijn gemeld en nog niet zijn verholpen, gebreken welke zijn ontstaan door het oplossen van eerder gemelde (rest)punten en gebreken welke niet eerder zijn opgemerkt en door de beheerder en de toekomstig onderhoudsaannemer Aquavia (dochter van KWS-infra) zijn opgemerkt. Een overzicht van de betreffende restpunten/gebreken is opgenomen in de bijlage.

Naast de in de bijlage genoemde restpunten is door de gebruiker van de nieuwe steiger aan de korte middenhavendam, de KLPD, aangegeven dat de steiger slecht toegankelijk is door achtergebleven steenresten. Het is ons echter op dit moment nog niet duidelijk of het hierbij gaat om achtergebleven stortsteen, de nieuw aangelegde kreukelberm of andere obstakels verbandhoudende met de aanleg van de steiger. Een en ander zal nog nader worden bekeken. Mocht blijken dat een en ander verband houdt met de door u uitgevoerde werkzaamheden dan zult u worden verzocht passende maatregelen te nemen.

Ik verzoek u de genoemde restpunten / gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen, doch uiterlijk voor 30 april 2009.

Met vriendelijke groet,


Contractmanager Project Zeeweringen



014181 2009 PZDT-B-09116 uitv
art 20ZLD 6107; havens Terneuzen, einde onderhoud

BIJLAGE 1 - OVERZICHT RESTPUNTEN / GEBREKEN

Behoort bij: pzdt-b-09116uitv


1. De houten damwand ter plaatse van de verborgen glooiing bij de Oosthavendam steekt boven de glooiing uit.
2. Op meerdere locaties binnen het werk is restafval en losse steen blijven liggen, vooral ter plaatse van locaties waar depots zijn ingericht. Rondom de middensluis liggen nog hopen steen en een betonblok in het grondwerk Zie ook bijgevoegde foto's.
3. De gekantelde betonblokken ter hoogte van de steiger aan de Oosthavendijk zijn behoorlijk verzakt.
4. Bij één bolder ter hoogte van het URS gebouw blijft nog water staan.
5. Ter plaatse van de verborgen glooiing bij de Middenhavendam staan nog steeds sporen in het grondwerk en steken stalen en kunststof (bind)banden uit het grondwerk.
6. Het pad van betonblokken ter plaatse van de aangebrachte verborgen glooiing bij de middenhavendam vertoont kieren, dit levert gevaar op voor fietsers van en naar verkeerspost, vooral in het donker.
7. Asstreep op het fietspad is nog niet verwijderd. Bij navraag bij het district en de gemeente is gebleken dat deze moet worden verwijderd.
8. Van het hekwerk ter plaatse van de lange middenhavendam ontbreekt een poer.
9. Afdeklaag van klei op het OSA is ter plaatse van de Middensluis grotendeels weggespoeld.
10. Bermen ter plaatse van de dijkovergang aan de Westhavendijk zijn nog niet hersteld.
11. Lantaarnpalen op de Westhavendijk staan nog steeds krom / scheef.
12. Situatie rondom het pellicht ligt er slecht bij en de drain welke is aangebracht functioneert niet. Water komt in een kuil terecht in plaat van dat het afwatert naar de Schelde. De constructie rondom uitmonding is aan het verzakken.
13. Ter plaatse van de tijdelijke dijkovergang op de westelijke havendijk licht de berm naast het fietspad/onderhoudspad over een lengte van ongeveer 15 meter vol met slakken.
14. Grondwerk ter plaatse van de locatie van de tijdelijke dijkovergang zit nog vol sporen.



Houten damwand steekt boven de glooiing uit



Verzakking aan de Oosthavendijk

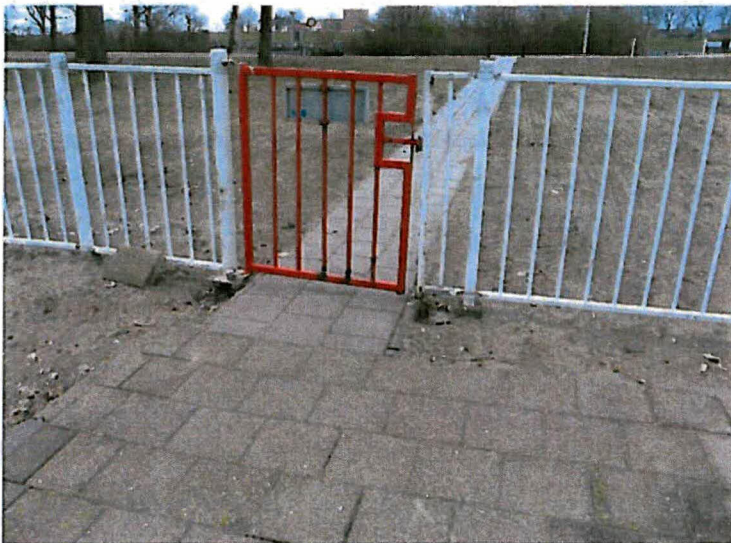

Ontbrekende poer



Sporen grondwerk middensluis



Achtergebleven binddraad in grondwerk



Kierende verharding van betonblokken



Steenresten in het grondwerk



Achtergebleven betonblok



Uitgespoelde afdeklaag



Scheefstaande lichtmasten



Situatie rondom pellicht



Situatie rondom pellicht



Situatie rondom pellicht



Situatie rondom pellicht



Situatie rondom pellicht



Uitmonding drainagebuis pellicht



Uitmonding drainagebuis pellicht



Bermen langs dijkovergang



Steenslag / slakken in berm ter plaatse van tijdelijke dijkovergang



Sporen in grondwerk ter plaatse van tijdelijke dijkovergang.
