



Simon Vereeke  
Raymond Derksen  
Roy v/d Voort  
Leden PBG

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**  
A.M. de Jong

T 088 246 13 70  
annemarie.de.jong@rws.nl

# memo

Revisietoetsing veldbezoek 16 mei 2011  
Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder  
dp 0836 – dp 0870 (Tholen 3)

**Datum**

16 november 2011

**Bijlage(n)**

1 glooiingskaart met  
eindscores beheerder

**Kenmerk**

PZDT-M-11142 rev

## Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder (kortweg Tholen 3). Dit werk is uitgevoerd in 2008 waarbij de oude bekleding is vervangen door basalton.

Het traject is gelegen op Tholen aan de Oosterschelde tussen dp 0836 en dp 0870. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.



Figuur 1: Luchtfoto Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder (Tholen 3)  
dp 0836 – dp 0870 (bron: [www.maps.google.nl](http://www.maps.google.nl))




016239 2011 PZDT-M-11142 rev

Revisietoetsing Tholen 3 Oud Kempenshofstede

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

Datum  
16 november 2011

Kenmerk  
PZDT-M-11142 rev

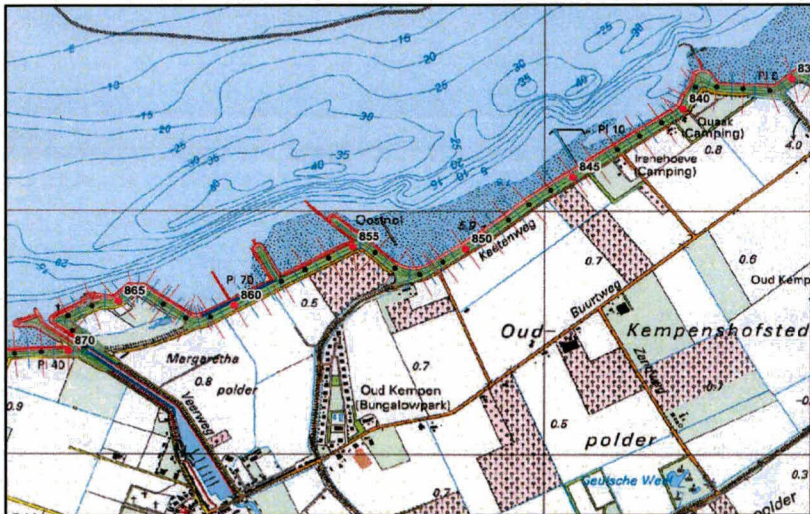

iguur 1: Kaart Oud Kempenshofstedepolder en Margarethapolder dp 0836 - dp 0870

### Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder (PZDT-R-06114 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met ontwerppeil 2060.

### Veldbezoek

Op maandag 16 mei 2011 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van waterschap Scheldestromen en A.M. de Jong van projectbureau Zeeweringen. De bekleding bestaande uit Basalton ziet er visueel goed en waterbouwtechnisch strak uit. Bij dp 0855 bestaan de aansluitingen bij de verborgen glooiing van hergeplaatste basalt en zien er visueel goed uit.

Bij dp 0858 bestaan de aansluitingen bij de verborgen glooiing van hergeplaatste basalt en zien er visueel goed uit.

Tussen dp 0855 en dp 0858 bestaat de glooiing aan de bovenkant zeer steil, dan heel flauw, daarna weer steil.

Tussen dp 0858 en dp 0862 ligt de berm +/- 2 meter hoger. Bij de steiger (dp 0865) bestaat de boothelling uit asfalt en zijn de overgang visueel goed.

Tussen dp 0865 en dp 0870 bestaat de bekleding uit een overlaging ingegoten met asfalt. De horizontale overgang naar basalton is niet ingegoten!

De aansluiting op de oude dijkbekleding van Suzannapolder is goed uitgevoerd.

De andere kant van het dijktraject sluit aan op de sluis van Stavenisse en is ook goed uitgevoerd.

Een punt van zorg is de slecht begroeide grasmat langs het onderhoudspad. Deze grasmat is ook ruim voorzien van slakken, grote en kleine steentjes. Dit geldt voor de gehele lengte van het traject.

In dit dijktraject zijn 3 (duik)trappen incl. leuningen aangelegd.

### Controle toetsing

De toetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in de rapportage "Actualisatie toetsing bekleding Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder (Tholen 3), dp 0836 - dp 0870" (PZDT-R-11270 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. In het rapport zijn diverse bijzonderheden / tekortkomingen opgenomen. Uitvoering van de voorgestelde maatregelen zijn afdoende om dit probleem op te lossen. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
16 november 2011

**Kenmerk**  
PZDT-M-11142 rev

### Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:  
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken  
Oosterschelde\Oud Kempenshofstede 0835-0870\Veldbezoek revisie 0836-0869  
2011\_05\_16.

### Conclusie


De nieuw aangebrachte glooiing van Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder (Tholen 3) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,



projectleider Techniek

Akkoord waterschap Scheldestromen,



directeur Waterkeringen en Wegen


21/11/ 2011

**BIJLAGE 1: GLOOIINGSKAART MET EINDSCORES BEHEERDER**

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
16 november 2011

**Kenmerk**  
PZDT-M-11142 rev

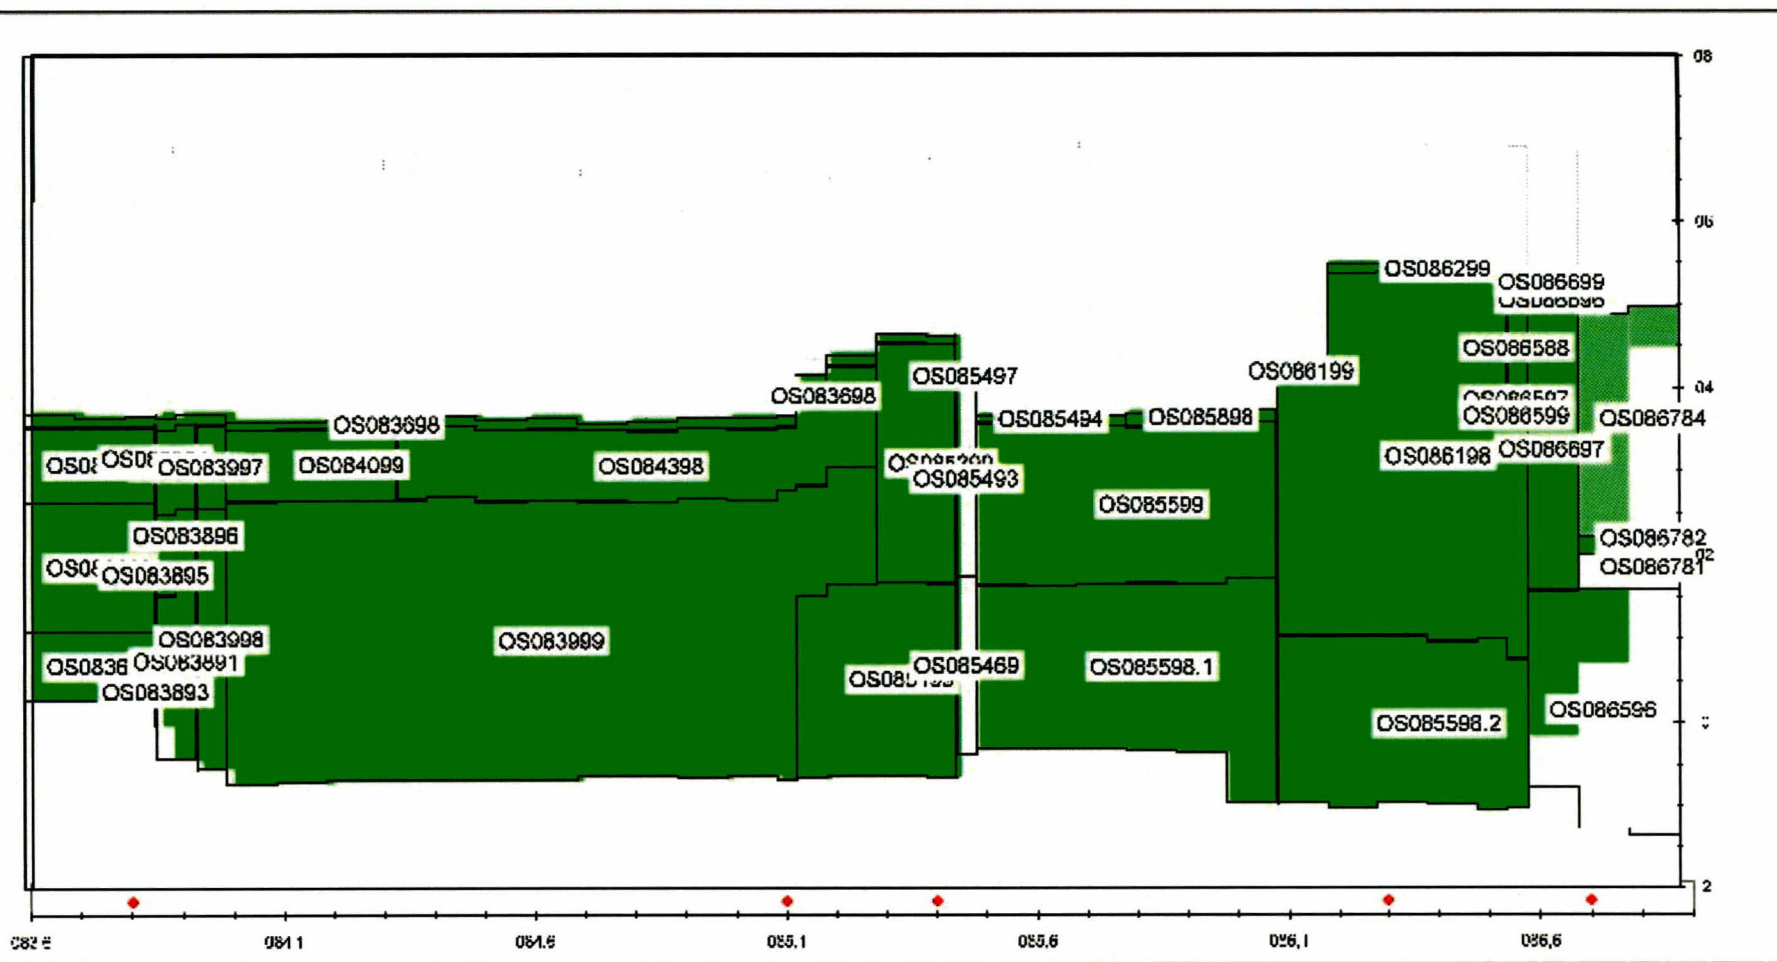

Label : vlakcode

Dyktafel Os 0836-0869 2011.1020 versie 4.05

Steentoets versie 4.04

stapgrootte 20 m

Legenda

08.1 goed

voldoende

voldoende ?

naderonderzoek

onvoldoende

geen oordeel

onzichtbaar vlak

totaal : 183,7 ( x 1000 m<sup>2</sup>)

Kenmerknr	Titel	Auteur	Datum
PZDB-B-13323	Verzoek toestemming om te werken rondom de Haven Sint Annaland (2015) in het stormseizoen	Voort, R. v/d	17-dec-2013
PZDB-R-13337	Ecologische eindopleving Karelpolder.	Braad, M.	19-dec-2013
PZDB-R-13336	Ecologische eindoplevingen Hollarepolder	Braad, M.	19-dec-2013
PZDB-M-13335	Quick scan natuurwetgeving verbetermaatregelen schor Stavenisse - Noordpolder. Datum: 19 de	Schoenmakers, A.	19-dec-2013
PZDB-B-14005	Eerder starten in Sophiahaven Roompot Beach Resort Kamperland tijdens dijkversterking Room	Voort, R. v/d	8-jan-2014
PZDB-B-14009	Ontvangstbevestiging rapportage Historische vooronderzoek explosieven dijktraject Hansweert 2	McGovern, A.	10-jan-2014
<i>vervallen</i> PZDT-M-11143	Revisietoetsing Oesterdam, Eerste en Tweede Bathpolder (ZLD-6311)	Bosters, R.	16-mei-2011
PZDT-M-13148	Controle / Vrijgave toetsing St Pieterspolder, Nieuw Olzendepolder	Voort, R. v/d	22-apr-2013
PZDT-V-13269	Verslag 5e voortgangsoverleg 31052561 Bruinisse 9 juli 2013	Wijkhuizen, G.J.	11-jul-2013
PZDT-V-13320	Verslag 5e voortgangsoverleg van 11 juli 2013 dijktraject Sint Philipsland	Otter, P. den	27-aug-2013
PZDT-V-13383	Verslag CBT-overleg Schorerpolder 30-9-2013	Wijkhuizen, G.J.	3-okt-2013
PZDT-B-13420	aanvulling tekortkoming v.d. Biggelaar/Liebregts Schorerpolder	Wijkhuizen, G.J.	25-okt-2013
PZDT-B-13430	Kwaliteit WAB Roggenplaat	Vermunt, S.	4-nov-2013
PZDT-V-13459	Verslag overleg prestatie meten Schorerpolder van 15 november 2013	Wijkhuizen, G.J.	20-nov-2013
PZDT-R-13498	Maandrapportage uitvoering	Vermunt, S.	10-dec-2013
PZDT-B-13503	Rapportage review contract Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland Aan: Wetterskip Fryslân	Vermunt, S.	17-dec-2013
PZDT-V-14005	Verslag overleg met NOB werken 2014/15 van 8 januari 2014	Wijkhuizen, G.J.	8-jan-2014
PZST-V-13098	1 omwonende dijktraject Moggershil 2014, 3 nov (Wanahoeve)	Pelgrim, R.	3-nov-2013
PZST-V-13097	1 omwonende dijktraject Stavenisse 2014, 3 nov (Stoutjesdijk)	Pelgrim, R.	3-nov-2013
PZST-V-13111	overleg WSV St-Annaland ivm dijkversterking 2015	McGovern, A.	27-nov-2013
PZST-V-13112	overleg Novanta ivm dijkversterking St-Annaland 2015	McGovern, A.	27-nov-2013
PZST-V-13113	overleg Enjoy Sailing en Creek Sails ivm dijkversterking St-Annaland 2015	McGovern, A.	27-nov-2013
PZST-V-13126	verslag over een gesprek in Ouwerkerk over Viane 2014 met omwonenden.	Haverkamp, L.	18-dec-2013
