

# Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Deelnemers  
A. van Leiden en E. Kooman (Gemeente  
Vlissingen), L. Wisse (WS Zeeuwse  
Eilanden), E. van Dijke (Rijkswaterstaat)

Afschrift aan  
Deelnemers, secretariaat  
Projectbureau Zeeweringen, Piet  
Hengst, Leo van Herwerden  
(Rijkswaterstaat), Ad Beaufort (WS  
Zeeuwse Eilanden), E. de Vis  
(Gemeente Vlissingen)

Verslag van  
Gemeentelijke verlichting havendam Buitenhaven  
Vlissingen.

Nummer  
PZDT-V-04340 ontw.

Datum verslag  
24 november 2004

Opgemaakt door  
E. van Dijke

Datum bespreking  
24 november 2004

Doorkiesnummer  
0118-621378 / 06-52044828

Bijlage(n)  
-

Door het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat zullen werkzaamheden verricht gaan worden aan de havendam van de Buitenhaven te Vlissingen. De bekleding van de dam zal verbeterd worden door het aanbrengen van een laag met gietasfalt gepenetreerde breuksteen en een laag waterbouwasfaltbeton op fosforslakken.

De werkzaamheden hebben consequenties voor de op en nabij de dam aanwezige openbare verlichting.

Op de bijlage is aangegeven om welke verlichting het gaat.

De volgende afspraken worden gemaakt:

- De voeding van de verlichting van het kunstwerk op de dam dient, voor het verbeteren van de bekleding op de dam, in een mantelbuis gelegd te worden. De gemeente zal dit t.z.t. regelen met de aannemer die de verbeteringswerken aan de dam gaat uitvoeren. Het aanleggen van de mantelbuis is voor rekening van de gemeente Vlissingen.
- De nieuwe bekleding van de dam zal zodanig aangebracht worden dat voorzieningen aan het kunstwerk (verwijderen, ophogen, of iets dergelijks) niet noodzakelijk zijn. De bekleding zal rondom op de betonnen voet aangesloten worden.
- De verlichting inclusief de betonnen platen langs het fiets-/voetpad zullen voor aanvang verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen worden op het terrein van het waterschap nabij de waterzuivering te Ritthem. De kabel wordt verwijderd. Voor rekening van de gemeente Vlissingen. Dit gebeurt ook in overleg met de aannemer die de verbeteringswerken gaat uitvoeren. Na het afronden van de werkzaamheden dienen deze herplaatst te worden.

De verwachting is dat het werk begin maart 2005 aanbesteed zal worden. Wanneer de aannemer die het werk gaat maken bekend is zal er een bespreking worden georganiseerd waarin de zaken m.b.t. kabels en leidingen zullen worden besproken.


Directie Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,  
Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax (0118) 62 19 93



008664 2004 PZDT-V-04340 ontw

d Ter gemeentelijke verlichting Buitenhaven Vlissingen

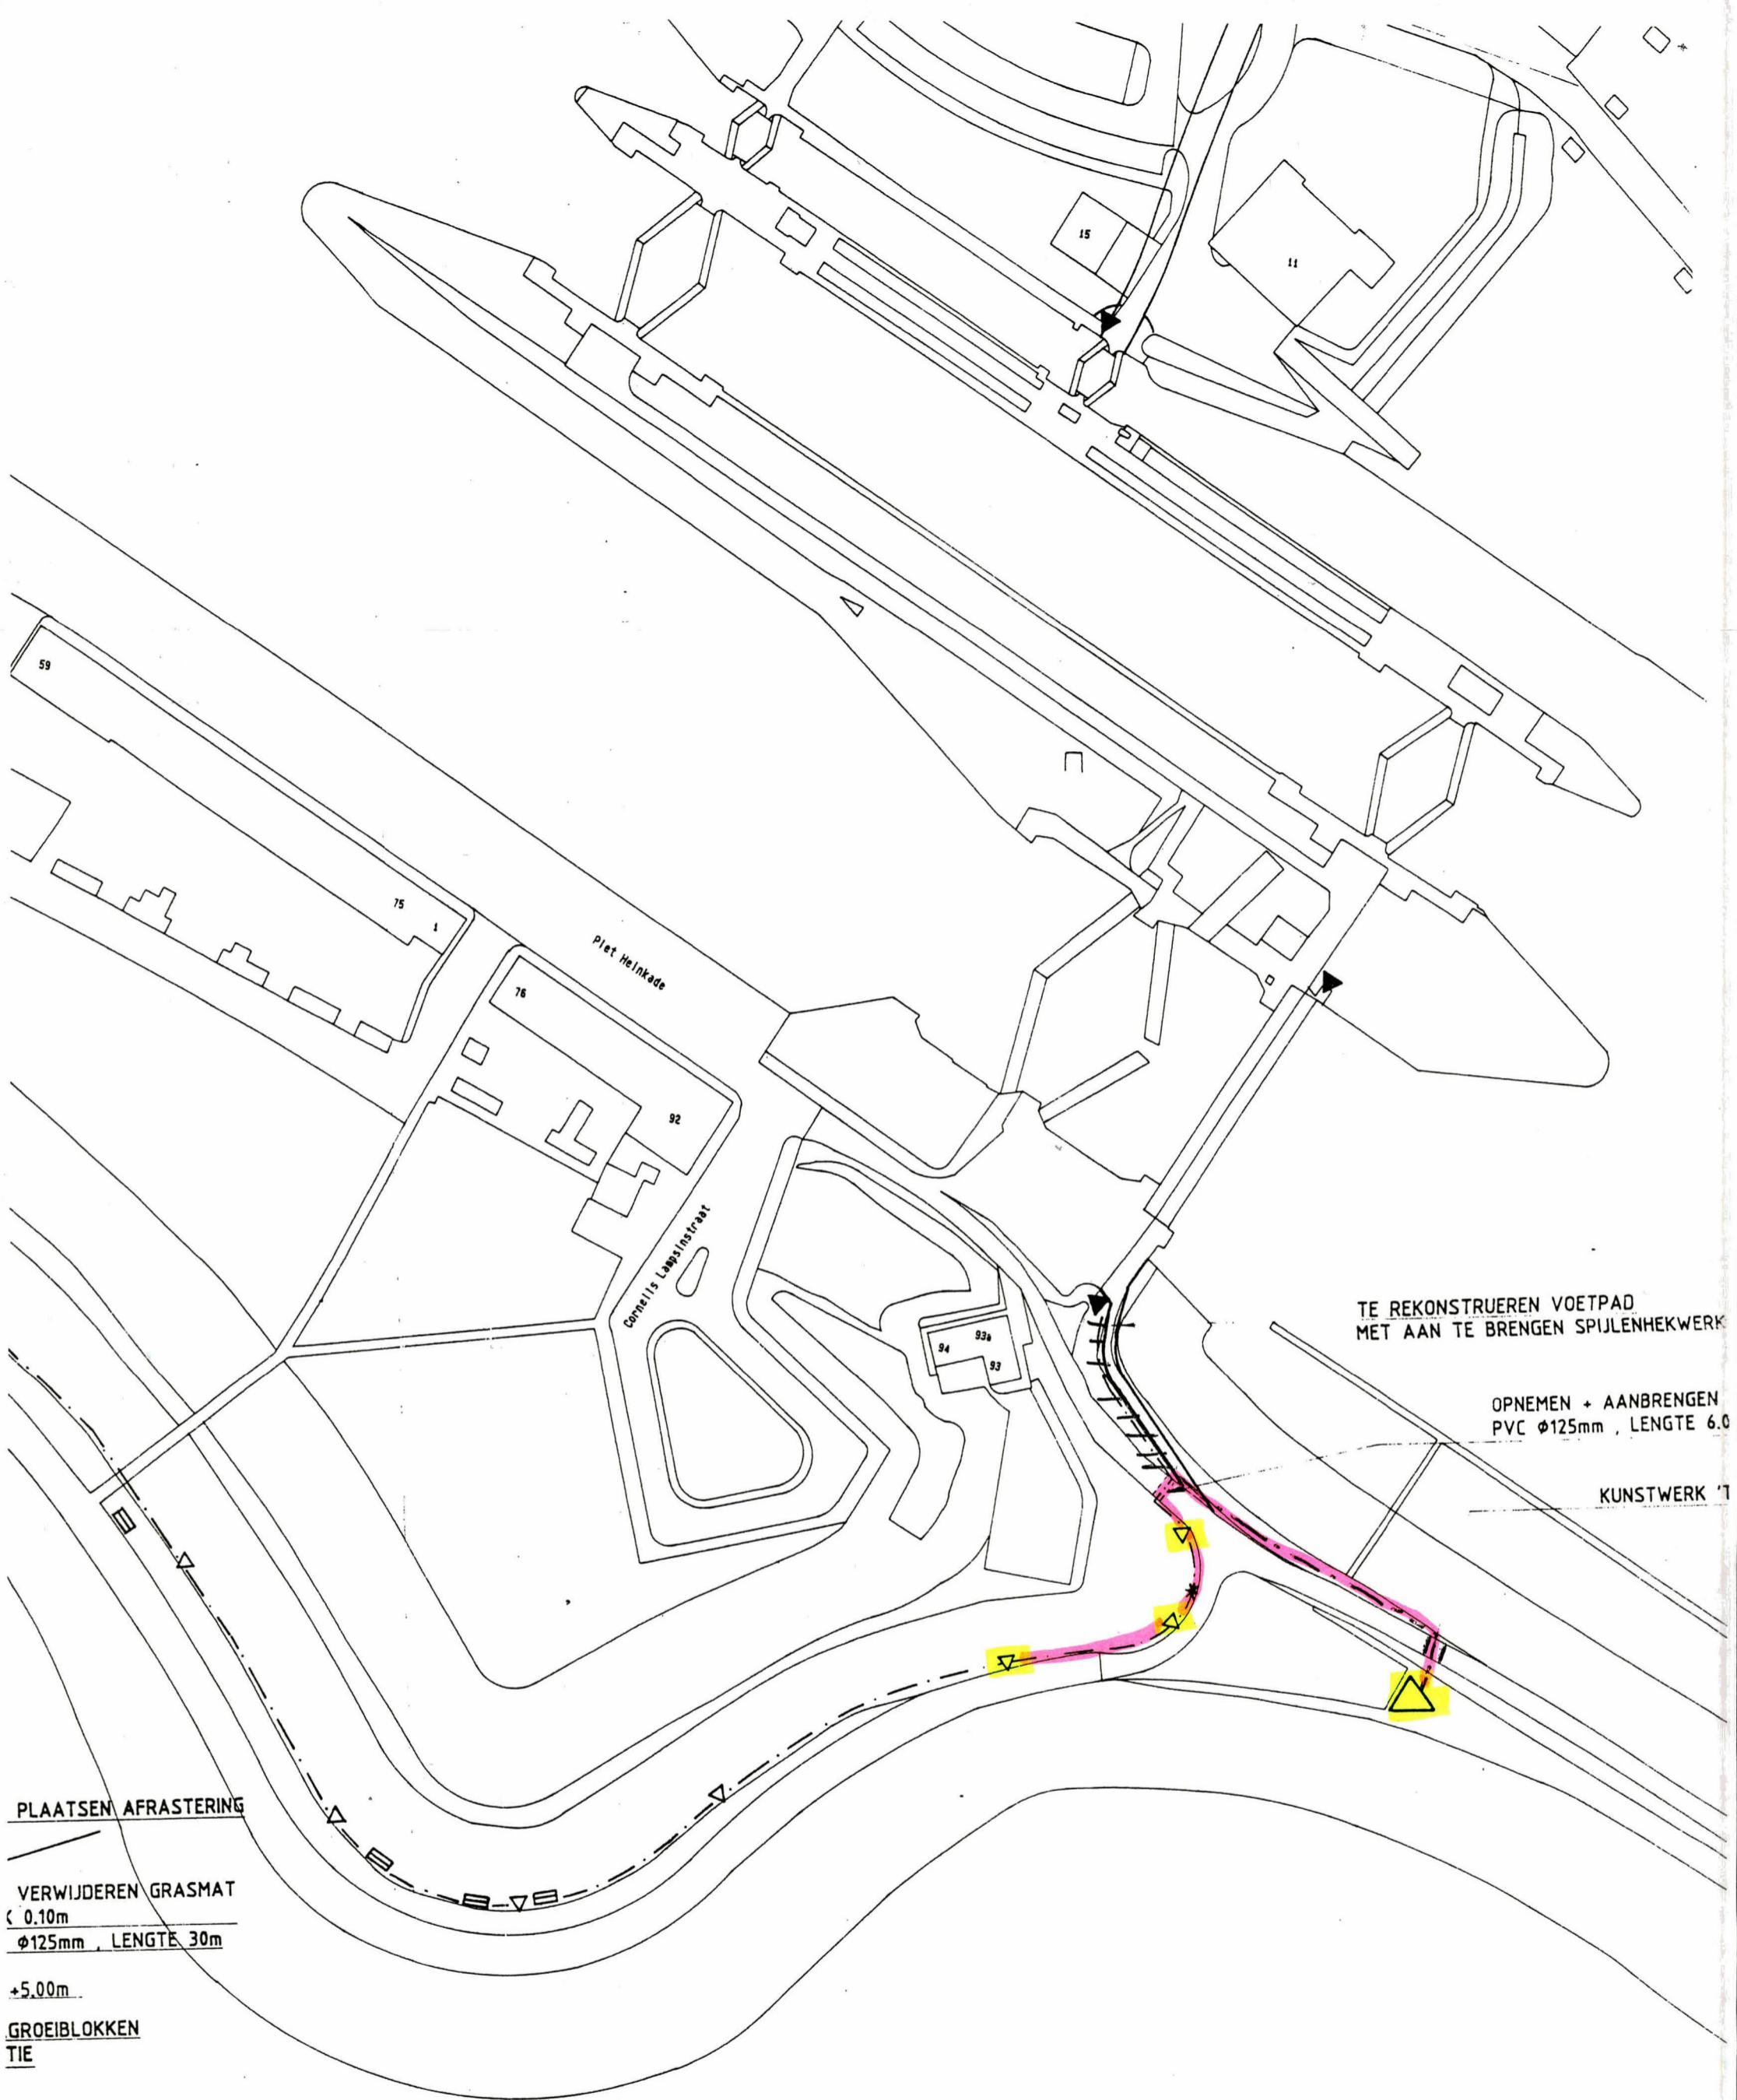

TE REKONSTRUEREN VOETPAD  
MET AAN TE BRENGEN SPIJLENHEKWERK

OPNEMEN + AANBRENGEN  
PVC Ø125mm , LENGTE 6.0

KUNSTWERK T

PLAATSEN AFRASTERING

VERWIJDEREN GRASMAT  
0.10m  
Ø125mm , LENGTE 30m

+5.00m

GROEIBLOKKEN  
TIE

**VERKLARING :**

- \* INFORMATIEBORD
- ▼ ROUTEBORD
- ≡ RUSTPUNT (BANK, PRULLEBAK, FIETSBEUGEL)
- ▽ BETONDRIEHOEK MET VERLICHTINGSELEMENT
- VOORZIENING VOOR LICHTMAST
- VERLICHTING
