

# verslag

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F 0118 62 1993  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**  
Klaas Kaslander

T 0118 62 1404  
klaas.kaslander@rws.nl

---

Verslag overleg Zonneplateau's Vlissingen  
Datum bespreking 10 maart 2009  
Deelnemers Wim Crusio (gemeente Vlissingen)  
Walter Vael (gemeente Vlissingen)  
Jan Risseeuw (gemeente Vlissingen)  
Hans Slemmer (architect)  
Hans Everaars (waterschap)  
Klaas Kaslander (projectbureau)  
Erik van Dijke (projectbureau)

**Datum**  
10 maart 2009

**Nummer**  
PZDT-V-09096 uitv

**Bijlage(n)**  
1

Afschrift aan Deelnemers  
Secretariaat PBZ  
Anneke McGovern (projectbureau)  
Bram Rietbergen (projectbureau)

---

Het overleg vindt plaats om een en ander af te stemmen met betrekking tot het realiseren van de zonneplateaus ter plaatse van de Boulevards Bankert en Evertsen.

Tijdens het overleg worden de volgende zaken besproken:

- De plaats van de zonneplateaus wordt vast gesteld. Het hart van de drie plateaus komen op de plaats zoals aangegeven op de bijlage bij dit verslag. De nieuwe plaats van de zonneplateau's heeft de voorkeur van Hans Slemmer omdat ten eerste de ondergrond van de plateaus identiek is en ten tweede omdat de plateau's nu dichter bij elkaar liggen en hiermee beter een eenheid uitstralen.
- Hans Slemmer geeft aan dat de leuningconstructie bij voorkeur 316L gepolijst staal moet zijn. Dit is in het contract met de aannemer opgenomen. Voorkeur is eveneens dat de bevestiging niet middels instorten, maar met een bevestigingsconstructie wordt gerealiseerd.
- Betreffende de afwerking van de bovenzijde van de plateau's wordt de voorkeur uitgesproken om een antisliplaag aan te brengen door er een profiel in te drukken. Een antisliplaag middels afstrooien of invegen is niet wenselijk.



014161 2009 PZDT-V-09096 uitv


Verslag met gemeente Vlissingen Boulevard Banke

- Aan de kleur van het beton is in het contract met de aannemer geen aanvullende eis gesteld. Wel is het de voorkeur van Hans Slemmer om de plateau's uit te voeren in een licht grijze kleur en deze vooraf te beoordelen aan de hand van een kleurstaal van de aannemer. Erik zal vragen of de aannemer deze ter beschikking stelt. Hans Slemmer geeft aan dat er m.b.t. de kleur ook aandacht moet zijn voor bekistingstijd.
- Erik van Dijke vraagt de gemeente of het gezien de veiligheid noodzakelijk is een hekwerk aan te brengen rondom het zonneplateau. Deze vraag is op een informatieavond het projectbureau voorgelegd. De gemeente vindt het echter niet noodzakelijk en bovendien brengt dit extra kosten met zich mee. Hans Slemmer geeft aan dat dit de uitstraling van de plateaus niet ten goede komt.
- Wim Crusio vraagt of het inschrijvingsvoordeel (raming minus aanneemsom) wordt verrekend op het afgesproken bedrag van de zonneplateau's, of dat dit voordeel kan worden vereffend door bijvoorbeeld een extra trap aan te brengen. Ook vraagt de gemeente of een eventuele gift van de aannemer bij de oplevering kan worden gebruikt voor een extra trap. Erik van Dijke geeft aan dat er geen verrekening plaats kan vinden omdat er voor de inschrijving geen gespecificeerde raming is gevraagd. Verder is het ongebruikelijk bij de Rijksoverheid dat de aannemer een gift geeft voor het aannemen van een werk.
- De gemeente vraagt of er op een andere manier een trap kan worden gerealiseerd op de glooiing in het verlengde van de Coosje Buskensstraat en de oostzijde van het Nollehoofd, bijvoorbeeld door de aan te brengen overlaging trapsgewijs te profileren. Erik van Dijke geeft aan dat de glooiing bij het Nollehoofd al is aangebracht, maar desondanks zal de mogelijkheid samen met de aannemer zal worden onderzocht.
- De strandwacht heeft het verzoek om het zand dat vrij hoog tegen de keermuur is opgewaaid over het strand te verdelen zodat enerzijds de zandhoogte bij de keermuur wordt verlaagd, en anderzijds het droogvallend strand wordt vergroot. Het waterschap is hiermee akkoord, en de aannemer zal dit uitvoeren.
- 'Blauw geruite kiel' is de gemeentelijke informatiepagina die wekelijks op woensdag verschijnt in het huis-aan-huisblad 'De Faam'. De gemeente zal hierin regelmatig een waarschuwing zetten het strand niet te betreden.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**  
10 maart 2009

**Nummer**  
PZDT-V-09096 uitv

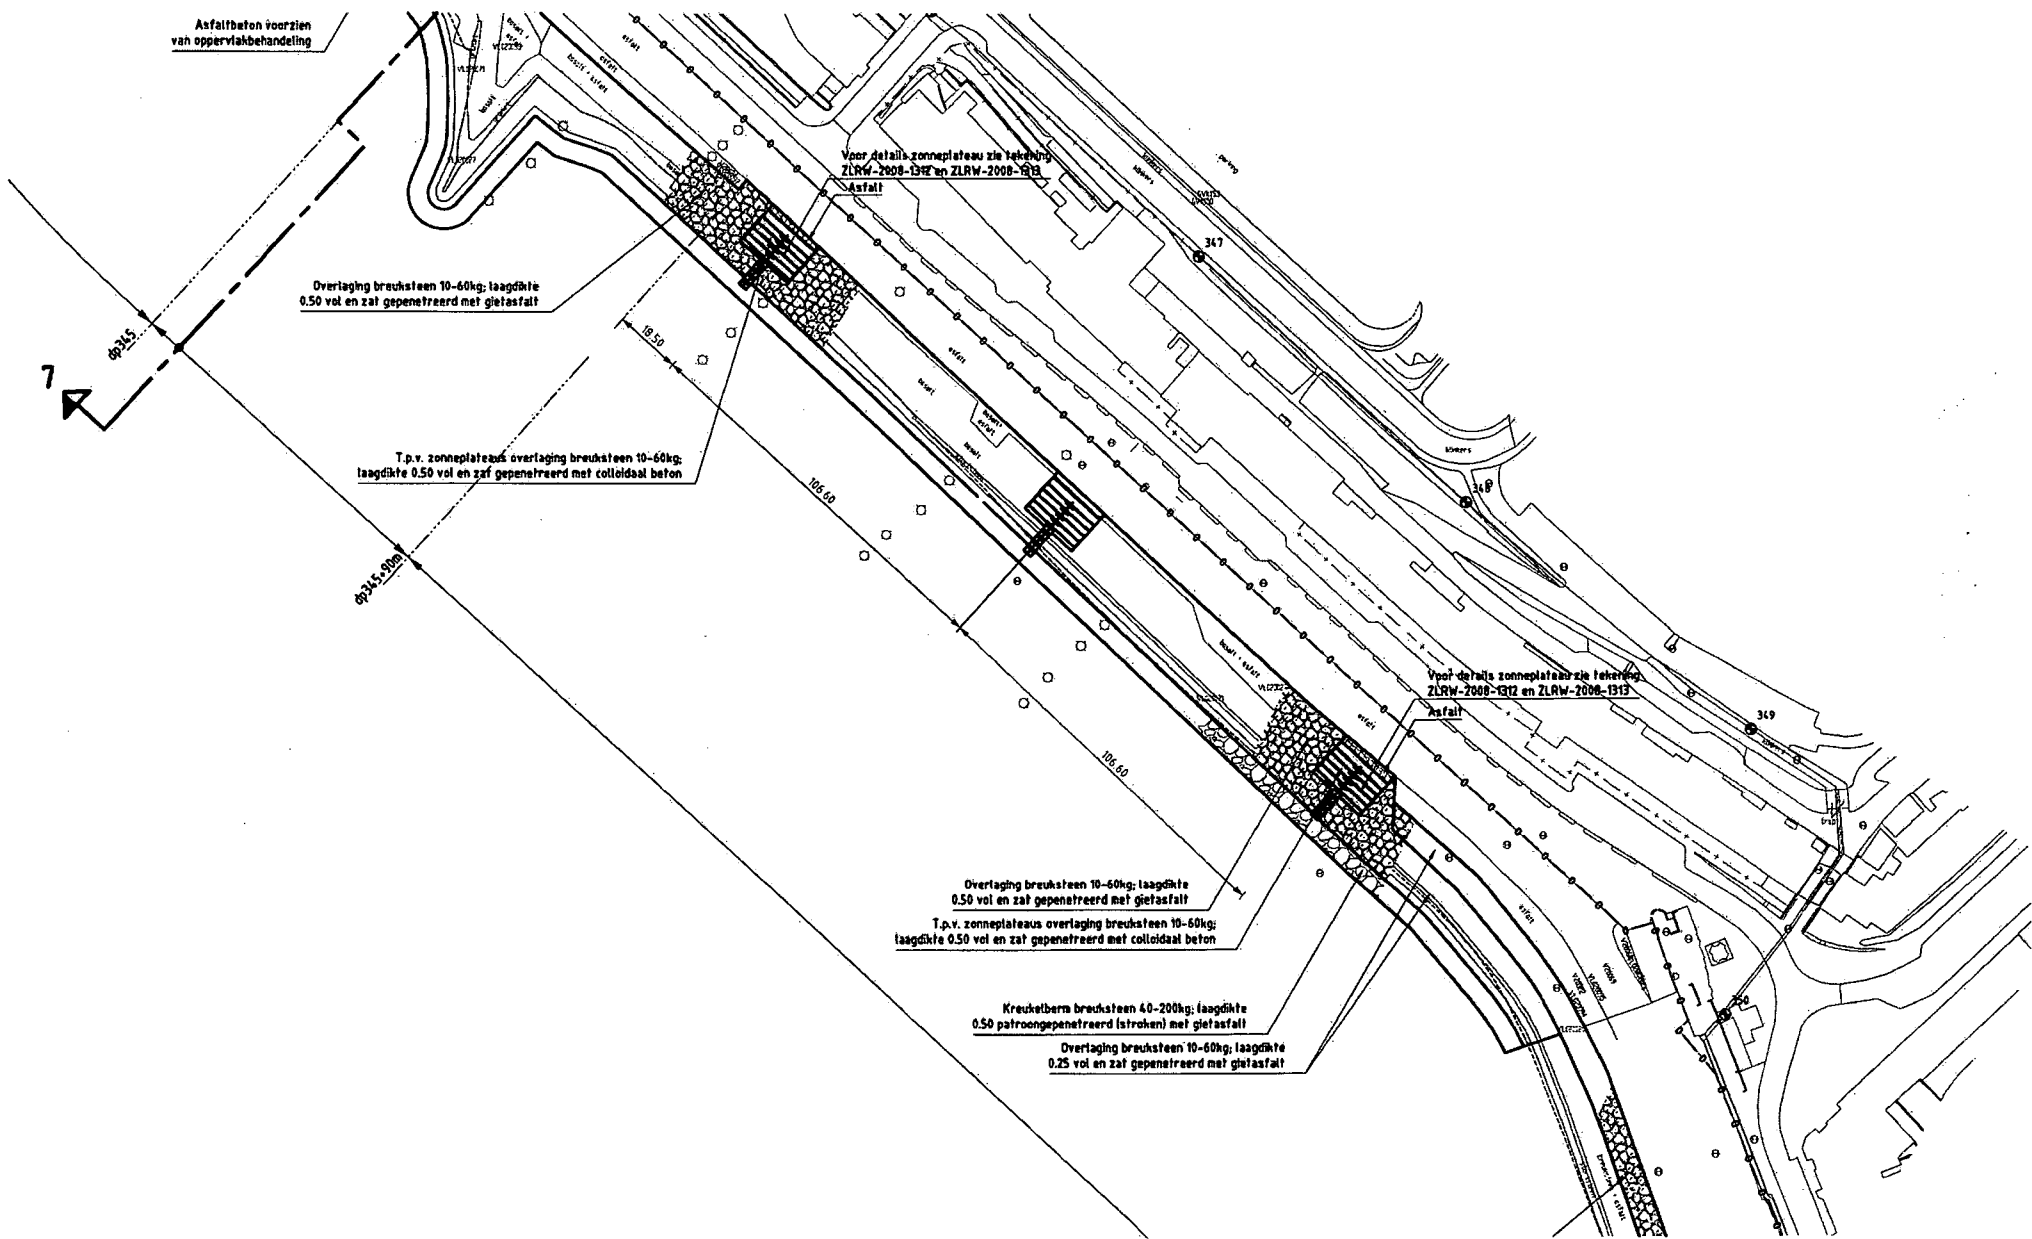

Asfaltbeton voorzien van oppervlakbehandeling

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt

T.p.v. zonneplateaus overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 vol en zat gepenetreerd met colloïdaal beton

Voor details zonneplateau zie tekening ZLRW-2008-1312 en ZLRW-2008-1313  
Asfalt

Voor details zonneplateau zie tekening ZLRW-2008-1312 en ZLRW-2008-1313  
Asfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt  
T.p.v. zonneplateaus overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.50 vol en zat gepenetreerd met colloïdaal beton

Kruisbarm breuksteen 40-200kg; laagdikte 0.50 patroongepenetreerd (stroken) met gietasfalt

Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.25 vol en zat gepenetreerd met gietasfalt
