HWD-WAK-0034

PROJECTPLANNING
NATUURCOMPENSATIE PERKPOLDER

ID	Task Name	Resource Names	Duration	Start	Finish	Predecessors	Tmin	Tmost	Tmax	Kans	Gevolg	% Complete
1	**PLANSTUDIEFASE**		1731 days?	Thu 7-5-09	Thu 31-12-15		0 days	1731 days?	0 days			9%
2	**VOORONTWERP**		378 days	Thu 7-5-09	Mon 25-10-10		0 days	378 days	0 days			44%
3	**Inventariseren huidige situatie**		229,06 days	Fri 28-8-09	Mon 19-7-10		0 days	229,06 days	0 days			13%
4	Inventarisatie bestaande gegevens		6 mons	Mon 1-2-10	Mon 19-7-10		0 days	6 mons	0 days			0%
5	**Kabels en leidingen**		45 days	Fri 28-8-09	Thu 29-10-09		0 days	45 days	0 days			47%
6	Inventarisatie bestaande gegevens	Luc Nijsten	6 wks	Fri 28-8-09	Thu 8-10-09		0 days	6 wks	0 days			70%
7	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Fri 9-10-09	Thu 15-10-09	6	0 days	1 wk	0 days			0%
8	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Fri 16-10-09	Thu 22-10-09	7	0 days	1 wk	0 days			0%
9	Verwerking commentaar	Luc Nijsten	1 wk	Fri 23-10-09	Thu 29-10-09	8	0 days	1 wk	0 days			0%
10	**Programma van Eisen**		105 days	Mon 15-6-09	Fri 6-11-09		0 days	105 days	0 days			100%
11	**Functie- en objectenboom**		86 days	Mon 15-6-09	Mon 12-10-09		0 days	86 days	0 days			100%
12	Opstellen functie- en objectenboom	Koen van Gerven	1 wk	Mon 15-6-09	Fri 19-6-09		0 days	1 wk	0 days			100%
13	Toetsing RH	Sjaak Remmits	1 wk	Mon 22-6-09	Fri 26-6-09	12	0 days	1 wk	0 days			100%
14	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	14,2 wks	Mon 29-6-09	Mon 5-10-09	13	0 days	14,2 wks	0 days			100%
15	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 6-10-09	Mon 12-10-09	14	0 days	1 wk	0 days			100%
16	**Programma van Eisen 1e concept**		85 days	Mon 13-7-09	Fri 6-11-09		0 days	85 days	0 days			100%
17	Opstellen Programma van Eisen 1e concept	Koen van Gerven	3 mons	Mon 13-7-09	Fri 2-10-09	15	0 days	3 mons	0 days			100%
18	Toetsing RH	Sjaak Remmits	1 wk	Sat 3-10-09	Fri 9-10-09	17	0 days	1 wk	0 days			100%
19	Toetsing DLG	DLG	1 wk	Mon 12-10-09	Fri 16-10-09	18	0 days	1 wk	0 days			100%
20	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Mon 19-10-09	Fri 23-10-09	19	0 days	1 wk	0 days			100%
21	Toetsing allen	WSZV, Prov, PPS	2 wks	Mon 26-10-09	Fri 6-11-09	20	0 days	2 wks	0 days			100%
22	**Opstellen ontwerpvarianten**		104 days	Mon 26-10-09	Mon 22-3-10		0 days	104 days	0 days			34%
23	Opstellen ontwerpvarianten	Koen van Gerven	18,2 wks	Mon 26-10-09	Mon 1-3-10	21FF+1 mon	0 days	18,2 wks	0 days			40%
24	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Tue 2-3-10	Mon 8-3-10	23	0 days	1 wk	0 days			0%
25	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 9-3-10	Mon 15-3-10	24	0 days	1 wk	0 days			0%
26	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 16-3-10	Mon 22-3-10	25	0 days	1 wk	0 days			0%
27	**Kostenraming VO**		35 days	Tue 16-3-10	Mon 3-5-10		0 days	35 days	0 days			0%
28	Opstellen kostenraming ontwerpvarianten	Henk Meinderts	1 mon	Tue 16-3-10	Mon 12-4-10	25	0 days	1 mon	0 days			0%
29	Toetsing RH	Koen van Gerven	1 wk	Tue 13-4-10	Mon 19-4-10	28	0 days	1 wk	0 days			0%
30	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 20-4-10	Mon 26-4-10	29	0 days	1 wk	0 days			0%
31	Verwerking commentaar	Henk Meinderts	1 wk	Tue 27-4-10	Mon 3-5-10	30	0 days	1 wk	0 days			0%
32	**Startnotitie MER**		288 days	Thu 7-5-09	Mon 21-6-10		0 days	288 days	0 days			57%
33	**Startnotitie 1e concept**		49 days	Thu 7-5-09	Fri 17-7-09		0 days	49 days	0 days			100%
34	Opstellen startnotitie 1e concept	Rob Speets	2 mons	Thu 7-5-09	Wed 1-7-09		0 days	2 mons	0 days			100%
35	Toetsing RH	Martin Groenewoud	2 days	Thu 2-7-09	Fri 3-7-09	34	0 days	2 days	0 days			100%
36	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Mon 6-7-09	Fri 10-7-09	35	0 days	1 wk	0 days			100%
37	Verwerken commentaar	Rob Speets	1 wk	Mon 13-7-09	Fri 17-7-09	36	0 days	1 wk	0 days			100%
38	**Startnotitie def concept**		152 days	Tue 21-7-09	Fri 19-2-10		0 days	152 days	0 days			100%
39	Opstellen startnotitie def concept	Rob Speets	1 mon	Tue 21-7-09	Mon 17-8-09	37	0 days	1 mon	0 days			100%
40	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Mon 14-9-09	Fri 18-9-09	39	0 days	1 wk	0 days			100%
41	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	2 wks	Mon 21-9-09	Fri 2-10-09	40	0 days	2 wks	0 days			100%
42	Toetsing werkgroep Wat en Nat		4 wks	Mon 5-10-09	Fri 30-10-09	41	0 days	4 wks	0 days			100%
43	Verwerken commentaar	Rob Speets	1 wk	Mon 2-11-09	Fri 6-11-09	42	0 days	1 wk	0 days			100%
44	Toetsing initiatiefnemers	WSZV, RWS	3 wks	Mon 9-11-09	Fri 27-11-09	43	0 days	3 wks	0 days			100%
45	Verwerken commentaar	Rob Speets	1 wk	Mon 23-11-09	Fri 27-11-09	44	0 days	1 wk	0 days			100%
46	Vrijgave initiatiefnemers	WSZV, RWS	9 wks	Mon 21-12-09	Fri 19-2-10	45	0 days	9 wks	0 days			100%
47	**Inspraakprocedure**		70 days	Tue 16-3-10	Mon 21-6-10		0 days	70 days	0 days			2%
48	Bekendmaking startnotitie	BG (Prov)	1 wk	Tue 16-3-10	Mon 22-3-10	46	0 days	1 wk	0 days			100%
49	Inspraak		6 wks	Tue 23-3-10	Mon 3-5-10	48	0 days	6 wks	0 days			0%
50	Infoavond Perkpolder		0 days	Thu 18-3-10	Thu 18-3-10		0 days	0 days	0 days			0%
51	Advies richtlijnen CMER		9 wks	Tue 23-3-10	Mon 24-5-10	48	0 days	9 wks	0 days			0%
52	Richtlijnen Bevoegd Gezag		13 wks	Tue 23-3-10	Mon 21-6-10	48	0 days	13 wks	0 days			0%
53	**MER**		130 days	Tue 27-4-10	Mon 25-10-10		0 days	130 days	0 days			0%
54	**Opstellen MER**		130 days	Tue 27-4-10	Mon 25-10-10		0 days	130 days	0 days			0%
55	Opstellen 1e concept MER	Rob Speets	5 mons	Tue 27-4-10	Mon 13-9-10	26FF+3 mons;52	5 mons	5 mons	7 mons			0%
56	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Tue 14-9-10	Mon 20-9-10	55	0 days	1 wk	0 days			0%
57	Toetsing DLG/RWS/Prov/Waterschap	Carolina van Nieuwkerk	3 wks	Tue 21-9-10	Mon 11-10-10	56	0 days	3 wks	0 days			0%
58	Verwerken commentaar	Rob Speets	2 wks	Tue 12-10-10	Mon 25-10-10	57	0 days	2 wks	0 days			0%
59												
60	**DEFINITIEF ONTWERP**		70 days?	Tue 14-9-10	Mon 20-12-10		0 days	70 days?	0 days			0%
61	**Programma van Eisen definitief**		35 days	Tue 14-9-10	Mon 1-11-10		0 days	35 days	0 days			0%
62	Opstellen Programma van Eisen definitief	Koen van Gerven	1 mon	Tue 14-9-10	Mon 11-10-10	55	1 mon	1 mon	1,25 mons			0%
63	Toetsing RH	Sjaak Remmits	1 wk	Tue 12-10-10	Mon 18-10-10	62	0 days	1 wk	0 days			0%
64	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 19-10-10	Mon 25-10-10	63	0 days	1 wk	0 days			0%
65	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 26-10-10	Mon 1-11-10	64	0 days	1 wk	0 days			0%
66	**Opstellen definitief ontwerp**		55 days	Tue 21-9-10	Mon 6-12-10		0 days	55 days	0 days			0%
67	Opstellen definitief ontwerp	Koen van Gerven	2 mons	Tue 21-9-10	Mon 15-11-10	65FF+2 wks	2 mons	2 mons	2,75 mons			0%
68	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Tue 16-11-10	Mon 22-11-10	67	0 days	1 wk	0 days			0%
69	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 23-11-10	Mon 29-11-10	68	0 days	1 wk	0 days			0%
70	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 30-11-10	Mon 6-12-10	69	0 days	1 wk	0 days			0%
71	7. Nulsituatie onvoldoende in beeld		0 mons	Mon 6-12-10	Mon 6-12-10	70	0 days	0 mons	0 days	9%	4 months	0%
72	8. Afstemming ontwikkelingen omgeving		0 mons	Mon 6-12-10	Mon 6-12-10	70	0 days	0 mons	0 days	7%	5 months	0%
73	34. Fusering waterschappen		0 mons	Mon 6-12-10	Mon 6-12-10	70	0 days	0 mons	0 days	30%	3,5 months	0%
74	35. Afstemming onderdelenverloopt moeizaam		0 mons	Mon 6-12-10	Mon 6-12-10	70	0 days	0 mons	0 days	11%	9 months	0%
75	**Kostenraming DO**		35 days	Tue 19-10-10	Mon 6-12-10		0 days	35 days	0 days			0%
76	Opstellen kostenraming DO	Koen van Gerven	1 mon	Tue 19-10-10	Mon 15-11-10	65FF+2 wks	1 mon	1 mon	1,25 mons			0%
77	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Tue 16-11-10	Mon 22-11-10	76	0 days	1 wk	0 days			0%
78	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 23-11-10	Mon 29-11-10	77	0 days	1 wk	0 days			0%
79	Verwerking commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 30-11-10	Mon 6-12-10	78	0 days	1 wk	0 days			0%
80	**PPI planning uitvoering**		32 days?	Fri 22-10-10	Mon 6-12-10		0 days	32 days?	0 days			0%
81	Opstellen PPI planning	Koen van Gerven	17 days?	Fri 22-10-10	Mon 15-11-10	65FF+2 wks	17 days	17 days	22 days			0%
82	Toetsing RH	Martin Groenewoud	1 wk	Tue 16-11-10	Mon 22-11-10	81	0 days	1 wk	0 days			0%
83	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Tue 23-11-10	Mon 29-11-10	82	0 days	1 wk	0 days			0%
84	Verwerken commentaar	Koen van Gerven	1 wk	Tue 30-11-10	Mon 6-12-10	83	0 days	1 wk	0 days			0%
85	**Projectplan Dijkverleggingsplan**		55 days	Tue 5-10-10	Mon 20-12-10		0 days	55 days	0 days			0%
86	Opstellen dijkverleggingsplan (projectplan)	Cathelijne van hasselen	6 wks	Tue 5-10-10	Mon 15-11-10	65FF+2 wks	6 wks	6 wks	8 wks			0%
87	Toetsing RH	Koen van Gerven	1 wk	Tue 16-11-10	Mon 22-11-10	86	0 days	1 wk	0 days			0%
88	Toetsing DLG/RWS/Prov/Waterschap	Carolina van Nieuwkerk	3 wks	Tue 23-11-10	Mon 13-12-10	87	0 days	3 wks	0 days			0%
89	Verwerken commentaar	Cathelijne van hasselen	1 wk	Tue 14-12-10	Mon 20-12-10	88	0 days	1 wk	0 days			0%
90	40. Draagvlak waterschap ontbreekt		0 days	Mon 20-12-10	Mon 20-12-10	89	0 days	0 days	0 days			0%
91	**VERGUNNINGEN- PROCEDURES OPDRACHTGEVER**		630 days?	Thu 7-5-09	Wed 12-10-11		0 days	630 days?	0 days			2%
92	**Vergunningenscan**		128 days?	Thu 7-5-09	Thu 5-11-09		0 days	128 days?	0 days			100%
93	Opstellen concept vergunningenscan	Marije van Hal	17 days?	Thu 7-5-09	Fri 29-5-09		0 days	17 days	0 days			100%
94	Toetsing RH	Koen Sneider	4 days	Mon 1-6-09	Thu 4-6-09	93	0 days	4 days	0 days			100%
95	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Fri 5-6-09	Thu 11-6-09	94	0 days	1 wk	0 days			100%
96	Toetsing werkgroep Wat en Nat		2 wks	Fri 16-10-09	Thu 29-10-09	95	0 days	2 wks	0 days			100%
97	Definitieve vergunningenscan	Marije van Hal	1 wk	Fri 30-10-09	Thu 5-11-09	96	0 days	1 wk	0 days			100%
98	**MER/Dijkverleggingsplan**		190 days	Tue 21-12-10	Mon 12-9-11		0 days	190 days	0 days			0%
99	Publicatie	Provincie Zeeland	1 wk	Tue 21-12-10	Mon 27-12-10	89;58;90;71;72;73	0 days	1 wk	0 days			0%
100	Inspraak		6 wks	Tue 28-12-10	Mon 7-2-11	99	0 days	6 wks	0 days			0%
101	Toetsingsadvies Cmer		5 wks	Tue 8-2-11	Mon 14-3-11	100	0 days	5 wks	0 days			0%
102	Verwerken zienswijze	Waterschap	12 wks	Tue 8-2-11	Mon 2-5-11	100	10 wks	12 wks	12 wks			0%
103	Goedkeuring GS	GS	13 wks	Tue 3-5-11	Mon 1-8-11	102	0 days	13 wks	0 days			0%
104	beroepstermijn	burgers	6 wks	Tue 2-8-11	Mon 12-9-11	103	0 days	6 wks	0 days			0%
105	25. Tegenhouden Perkpolder dmv inspraak		0 mons	Mon 12-9-11	Mon 12-9-11	104	0 days	0 mons	0 days	7,5%	9 months	0%
106	**Vergunning & procedures**		245 days	Tue 21-9-10	Mon 29-8-11		0 days	245 days	0 days			0%
107	Opstellen vergunning aanvragen		13 wks	Tue 21-9-10	Mon 20-12-10	89FF	11 wks	13 wks	17 wks			0%
108	Toetsing RH		2 wks	Tue 21-12-10	Mon 3-1-11	107	0 days	2 wks	0 days			0%
109	Toetsing DLG		2 wks	Tue 4-1-11	Mon 17-1-11	108	0 days	2 wks	0 days			0%
110	**Waterwet**		160 days	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11		0 days	160 days	0 days			0%
111	2) Vergunning werkzaamheden waterkering / Waterw	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
112	3) Vergunning / Waterwet - RWS (voorheen Wbr)	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
113	8) Vergunning keelstoot Waterwet - WSZV (voorheen	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
114	**Toekomstige WABO**		120 days	Tue 18-1-11	Mon 4-7-11		0 days	120 days	0 days			0%
115	24) Verordening of ontheffing / provinciale wegenverc	RH	6 mons	Tue 18-1-11	Mon 4-7-11	109	0 days	6 mons	0 days			0%
116	**Overige Vergunning**		160 days	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11		0 days	160 days	0 days			0%
117	4) Vergunning / Ontgrondingenwet - Provincie Zeela	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
118	5) Vergunning / Natuurbeschermingswet - Minister	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
119	6) Ontheffing / Flora- en faunawet - Ministerie van LN	RH	32 wks	Tue 18-1-11	Mon 29-8-11	109	0 days	32 wks	0 days			0%
120	23) Vergunning / Wet beheer Rijkswaterstaatwerken -	RH of aannemer	6 mons	Tue 18-1-11	Mon 4-7-11	109	0 days	6 mons	0 days			0%
121	26) Vergunning / Wegenwet - Wegbeheerder	RH of aannemer	4 mons	Tue 18-1-11	Mon 9-5-11	109	0 days	4 mons	0 days			0%
122	28. Procedures en vergunningen conflicteren		0 days	Mon 29-8-11	Mon 29-8-11	111	0 days	0 days	0 days	5%	7,5 months	0%
123	37. Protest / verzet vanuit gegeving		0 mons	Mon 29-8-11	Mon 29-8-11	111	0 days	0 mons	0 days	25%	10 months	0%
124	**Overzicht vergunningsvoorwaarden**		32 days	Tue 30-8-11	Wed 12-10-11		0 days	32 days?	0 days			0%
125	Opstellen overzicht vergunningsvoorwaarden	Marije van Hal	17 days	Tue 30-8-11	Wed 21-9-11	122;123	17 days	17 days	27 days			0%
126	Toetsing RH	Koen Sneider	1 wk	Thu 22-9-11	Wed 28-9-11	125	0 days	1 wk	0 days			0%
127	Toetsing DLG	Carolina van Nieuwkerk	1 wk	Thu 29-9-11	Wed 5-10-11	126	0 days	1 wk	0 days			0%
128	Definitieve vergunningensvoorwaarden	Marije van Hal	1 wk	Thu 6-10-11	Wed 12-10-11	127	0 days	1 wk	0 days			0%
129												
130	**PRE-CONTRACTUELE FASE**		340,94 days	Thu 9-12-10	Thu 29-3-12		12,83 mons	340,94 days	18,83 mons			0%
131	**Aanbestedingsdossier**		90 days	Thu 9-12-10	Thu 14-4-11		0 days	90 days	0 days			0%
132	Basisovereenkomst en Vraagspec 1	Sjaak Remmits	2 mons	Thu 9-12-10	Thu 3-2-11	70FF+1 mon	1,75 mons	2 mons	2,5 mons			0%
133	Opstellen Vraagspec 2	Sjaak Remmits	2 mons	Thu 6-1-11	Thu 3-3-11	132FF+1 mon	1,75 mons	2 mons	2,5 mons			0%
134	Opstellen annexen	Sjaak Remmits	2 mons	Thu 6-1-11	Thu 3-3-11	133FF+1 mon	1,75 mons	2 mons	2,5 mons			0%
135	Duration=RiskVARY(Triang;-0,25;1;+0,5;+-)	Sjaak Remmits	1 mon	Thu 3-3-11	Thu 31-3-11	133;134	0,75 mons	1 mon	1,5 mons			0%
136	20. Grondverwerving loopt vertraging op		0 days	Thu 31-3-11	Thu 31-3-11	135	0 days	0 days	0 days	6%	10 months	0%
137	SNIP 5: Uitvoeringsbesluit		2 wks	Thu 31-3-11	Thu 14-4-11	136	0 days	2 wks	0 days			0%
138	**Marktbenadering**		207,94 days	Tue 14-6-11	Thu 29-3-12		0 days	207,94 days	0 days			0%
139	Selectiefase	Sjaak Remmits	3 mons	Tue 14-6-11	Tue 6-9-11	137	2,5 mons	3 mons	4 mons			0%
140	Aanbiedings- en gunningsfase	Sjaak Remmits	6 mons	Thu 13-10-11	Wed 28-3-12	139FS-2 mons;1	5,5 mons	6 mons	7 mons			0%
141	17. Ontwerp aannemer is niet beheervriendelijk		0 mons	Wed 28-3-12	Wed 28-3-12	140	0 days	0 mons	0 days	4,5%	5 months	0%
142	18. Aanbieding m.b.t. innovatie en duurzaamheid onvoldoen		0 mons	Wed 28-3-12	Wed 28-3-12	140	0 days	0 mons	0 days	5%	4 months	0%
143	46. Aannemers niet beschikbaar		0 mons	Wed 28-3-12	Wed 28-3-12	140	0 days	0 mons	0 days	2%	8,5 months	0%
144	Gunning	Sjaak Remmits	1 day	Thu 29-3-12	Thu 29-3-12	141;142;143	0 days	1 day	0 days			0%
145												
146	**REALISATIEFASE (uitvoering)**		120 days	Fri 30-3-12	Thu 13-9-12		0 days	120 days	0 days			0%
147	Mobilisatiefase		6 mons	Fri 30-3-12	Thu 13-9-12	144	0 days	6 mons	0 days			0%
148	**Vergunningen&procedures aannemer**		980 days	Fri 30-3-12	Thu 31-12-15		0 days	980 days	0 days			0%
149	Voorbereiden vergunningsaanvragen		2 mons	Fri 30-3-12	Thu 24-5-12	144	0 days	2 mons	0 days			0%
150	**Waterwet**		120 days	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12		0 days	120 days	0 days			0%
151	9) Melding / besluit bodemkwaliteit - RWS Zeeland	aannemer	1 wk	Fri 25-5-12	Thu 31-5-12	149	0 days	1 wk	0 days			0%
152	11) Tijdelijke vergunning / Waterwet - RWS Zeeland	aannemer	6 mons	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	6 mons	0 days			0%
153	12) Vergunning of melding Waterwet - Provincie Zeeland	aannemer	6 mons	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	6 mons	0 days			0%
154	13) Vergunning of melding Waterwet - WSZV, RWS (of de	aannemer	6 mons	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	6 mons	0 days			0%
155	14) Vergunning / Waterwet - Waterschap Zeeuws Vlaande	aannemer	6 mons	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	6 mons	0 days			0%
156	**Wabo**		120 days	Thu 24-5-12	Thu 8-11-12		0 days	120 days	0 days			0%
157	7) Vergunning of melding / Wet milieubeheer of Activiteiter	aannemer	6 mons	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	6 mons	0 days			0%
158	10) Aanlegvergunning / Stelsel in Bestemmingsplan - Gen	aannemer	14 wks	Fri 25-5-12	Thu 30-8-12	149	0 days	14 wks	0 days			0%
159	15) Opbreekvergunning - Gemeente Hulst	aannemer	12 wks	Fri 25-5-12	Thu 16-8-12	149	0 days	12 wks	0 days			0%
160	16) Sloopvergunning - Gemeente Hulst	aannemer	13 wks	Fri 25-5-12	Thu 23-8-12	149	0 days	13 wks	0 days			0%
161	17) Aanlegvergunning / Stelsel in Bestemmingsplan - Gen	aannemer	8 wks	Fri 25-5-12	Thu 19-7-12	149	0 days	8 wks	0 days			0%
162	18) Ontheffing / Provinciale wegenverordening - Provincie	aannemer	0 wks	Thu 24-5-12	Thu 24-5-12	149	0 days	0 wks	0 days			0%
163	19) Bouwvergunning / Woningwet - Gemeente Hulst	aannemer	24 wks	Fri 25-5-12	Thu 8-11-12	149	0 days	24 wks	0 days			0%
164	20) Kapvergunning / Besluit of Ontheffing / APV - LNV (LB	aannemer	8 wks	Fri 25-5-12	Thu 19-7-12	149	0 days	8 wks	0 days			0%
165	21) Melding of vergunning / APV - Gemeente Hulst	aannemer	0 wks	Thu 24-5-12	Thu 24-5-12	149	0 days	0 wks	0 days			0%
166	**Overige vergunningen**		40 days	Fri 25-5-12	Thu 19-7-12		0 days	40 days	0 days			0%
167	22) Melding / Wet WION - Kadaster	aannemer	1 wk	Fri 25-5-12	Thu 31-5-12	149	0 days	1 wk	0 days			0%
168	23) Verkeersbesluit / Wegenverkeerswet - Wegbeheerder	aannemer	8 wks	Fri 25-5-12	Thu 19-7-12	149	0 days	8 wks	0 days			0%
169	**Realisatie**		860 days	Fri 14-9-12	Thu 31-12-15	110;114;116;147	0 days	860 days	0 days			0%
170	**WP 4 Contractbeheersing**		860 days	Fri 14-9-12	Thu 31-12-15		0 days	860 days	0 days			0%
171	Realisatie (begeleiding)		31 mons	Fri 14-9-12	Thu 29-1-15	140;141;142;143	28 mons	31 mons	37 mons			0%
172	4. Budgetoverschrijding		0 mons	Thu 29-1-15	Thu 29-1-15	171	0 days	0 mons	0 days	5%	8,5 months	0%
173	13. Ontwerpfouten		0 mons	Thu 29-1-15	Thu 29-1-15	171	0 days	0 mons	0 days	4,5%	4,5 months	0%
174	19. Niet de juiste functionele eisen gesteld		0 mons	Thu 29-1-15	Thu 29-1-15	171	0 days	0 mons	0 days	5%	5,5 months	0%
175	21. Aantreffen vervuilde grond		0 mons	Thu 29-1-15	Thu 29-1-15	171	0 days	0 mons	0 days	4%	5 months	0%
176	27. Aanwezigheid beschermde Flora en Fauna		0 mons	Thu 29-1-15	Thu 29-1-15	171	0 days	0 mons	0 days	4%	8 months	0%
177	WP 4.3 Oplevering / overdracht		12 mons	Fri 30-1-15	Thu 31-12-15	171;172;173;174	0 days	12 mons	0 days			0%
178	MIJLPAAL SNIP 6: Opleveringsbesluit		0 days	Thu 31-12-15	Thu 31-12-15	177	0 days	0 days	0 days			0%
179												
180	**VERGADERINGEN**		115 days	Thu 11-2-10	Thu 22-7-10		0 days	115 days	0 days			0%
181	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 11-2-10	Thu 11-2-10		0 days	0 days	0 days			0%
182	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 4-3-10	Thu 4-3-10		0 days	0 days	0 days			0%
183	Werkgroep Waterkering en Natuur		0 days	Mon 8-3-10	Mon 8-3-10		0 days	0 days	0 days			0%
184	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 1-4-10	Thu 1-4-10		0 days	0 days	0 days			0%
185	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 29-4-10	Thu 29-4-10		0 days	0 days	0 days			0%
186	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 27-5-10	Thu 27-5-10		0 days	0 days	0 days			0%
187	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 24-6-10	Thu 24-6-10		0 days	0 days	0 days			0%
188	Projectteam overleg Perkpolder		0 days	Thu 22-7-10	Thu 22-7-10		0 days	0 days	0 days			0%

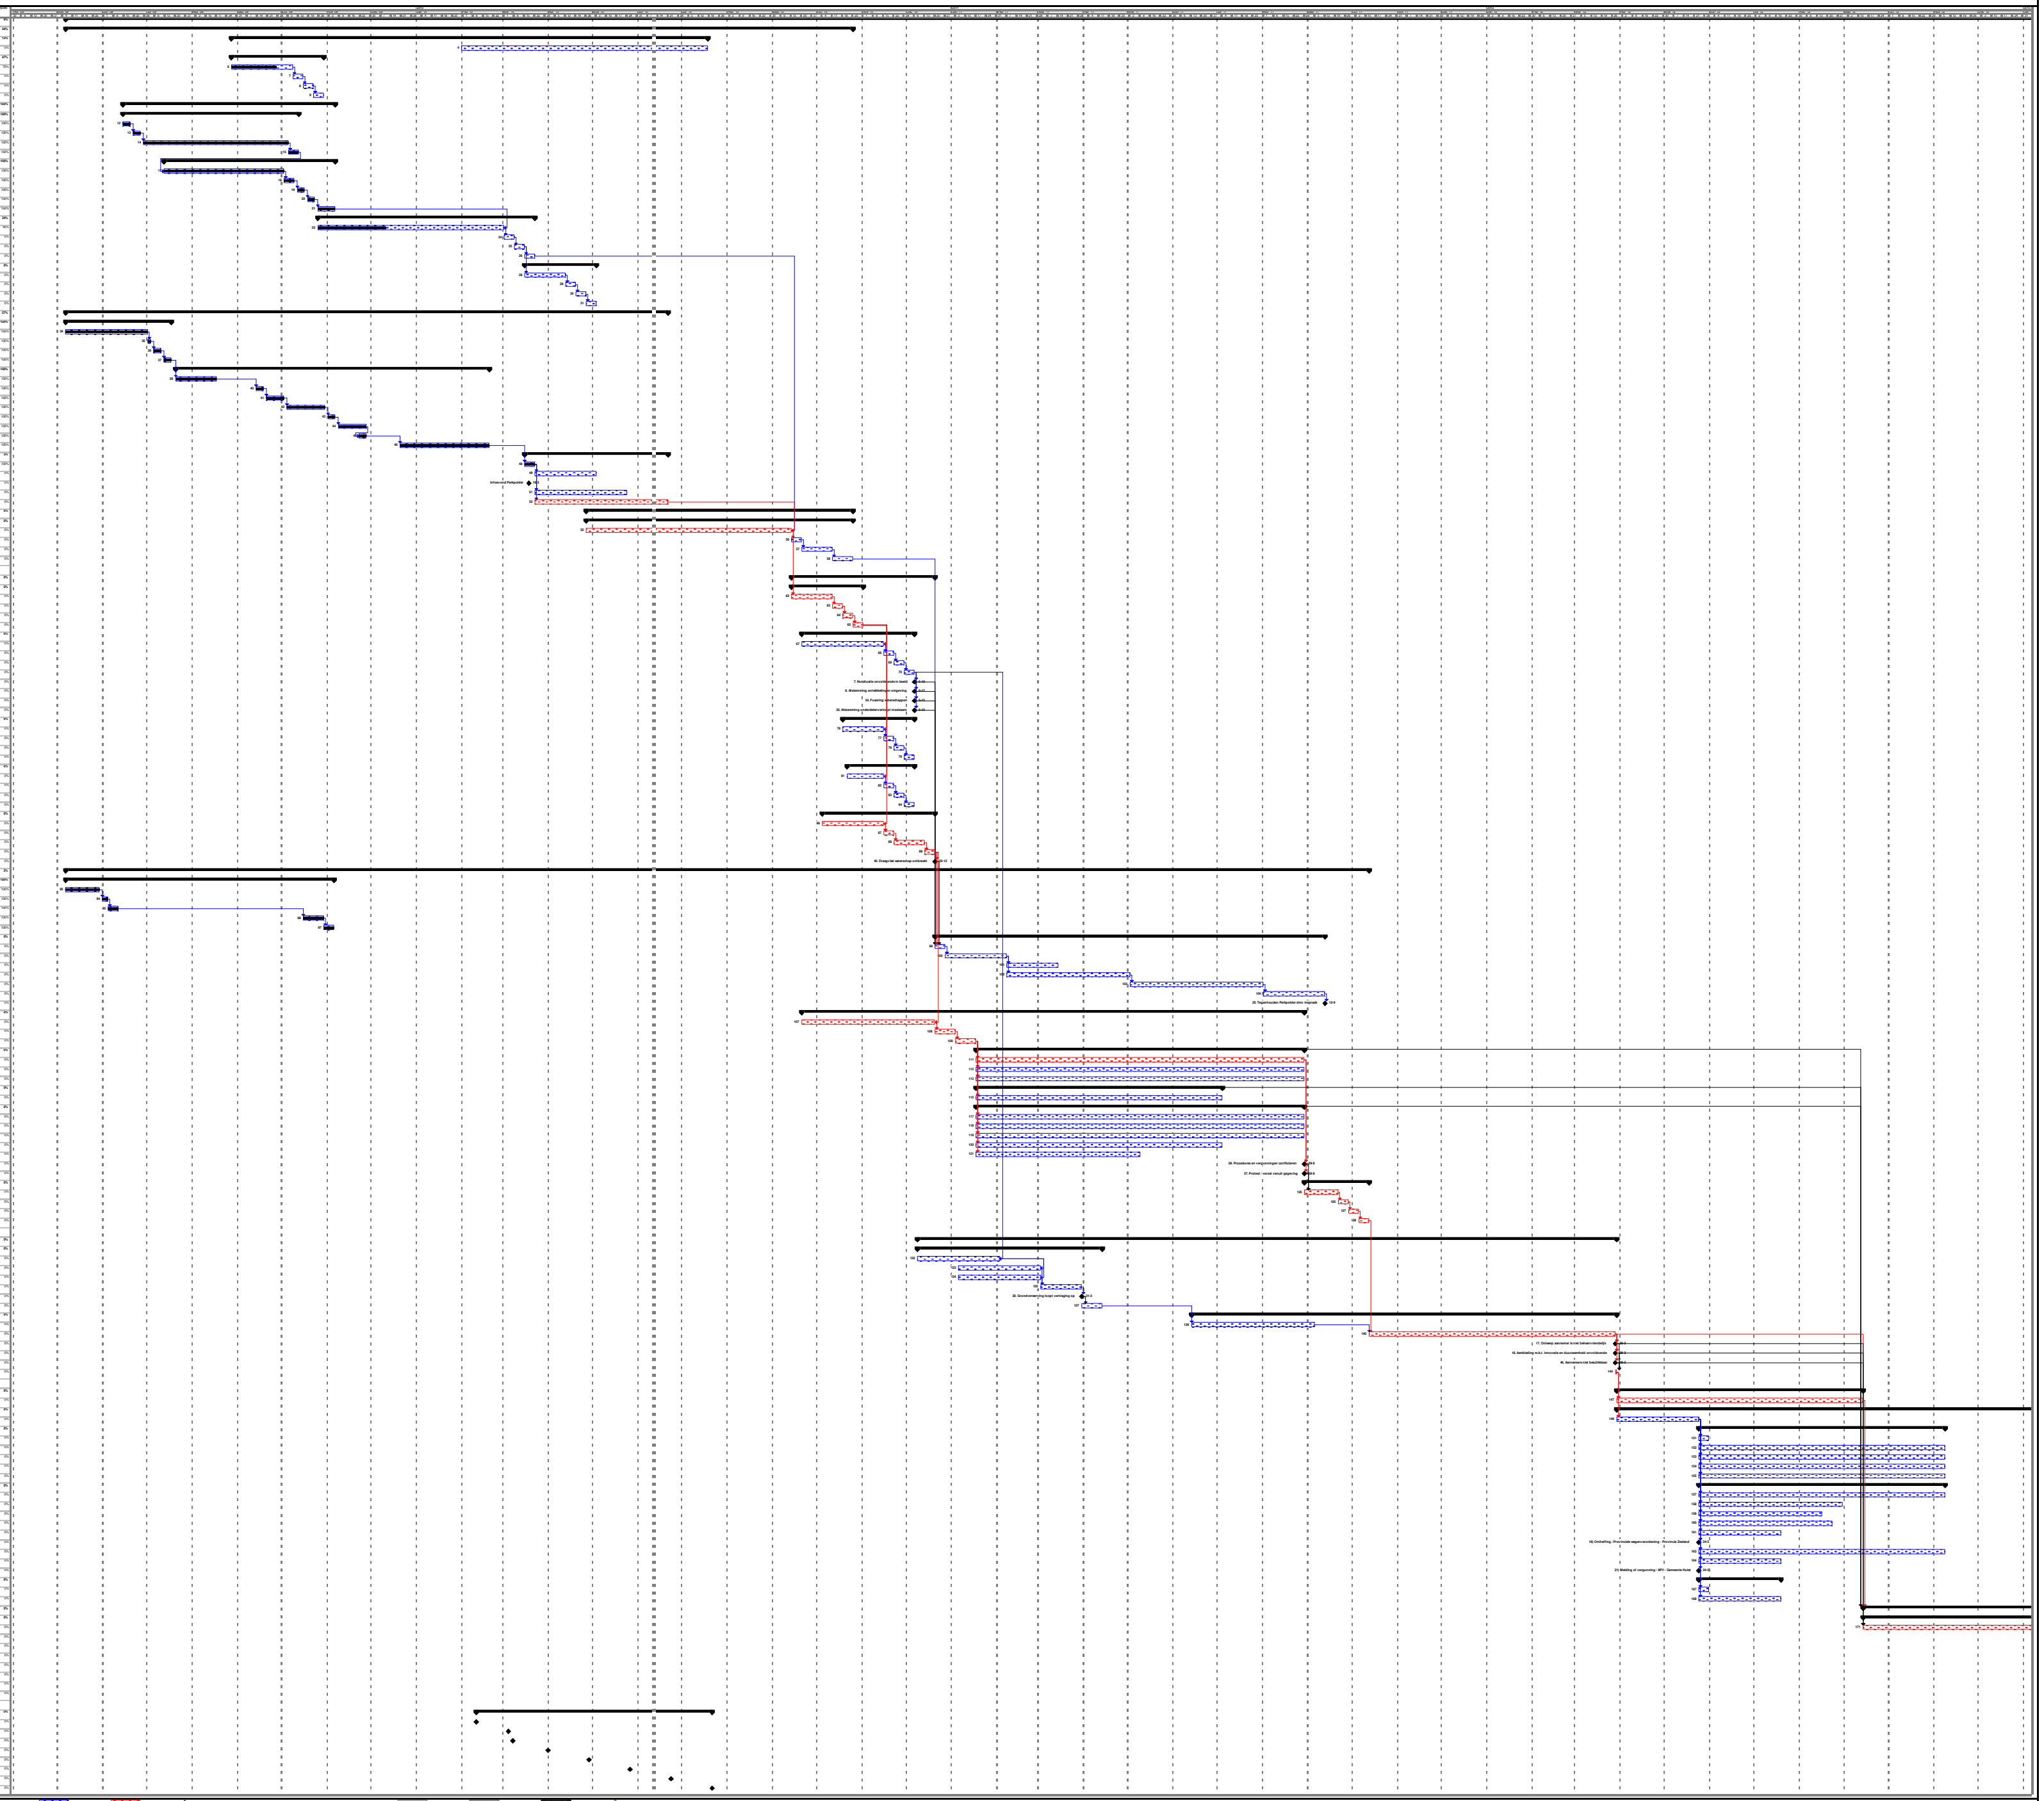

versie f d.d. 09-04-2009
status: voorlopig

Task | Critical Task | Progress | Milestone | Summary | Rolled Up Task | Rolled Up Critical Task | Rolled Up Milestone | Rolled Up Progress | Split | External Tasks | Project Summary | Group By Summary | Deadline

Bestand: 9T4564 Projectplanning Perkpolder v12_PPI.mpp
